


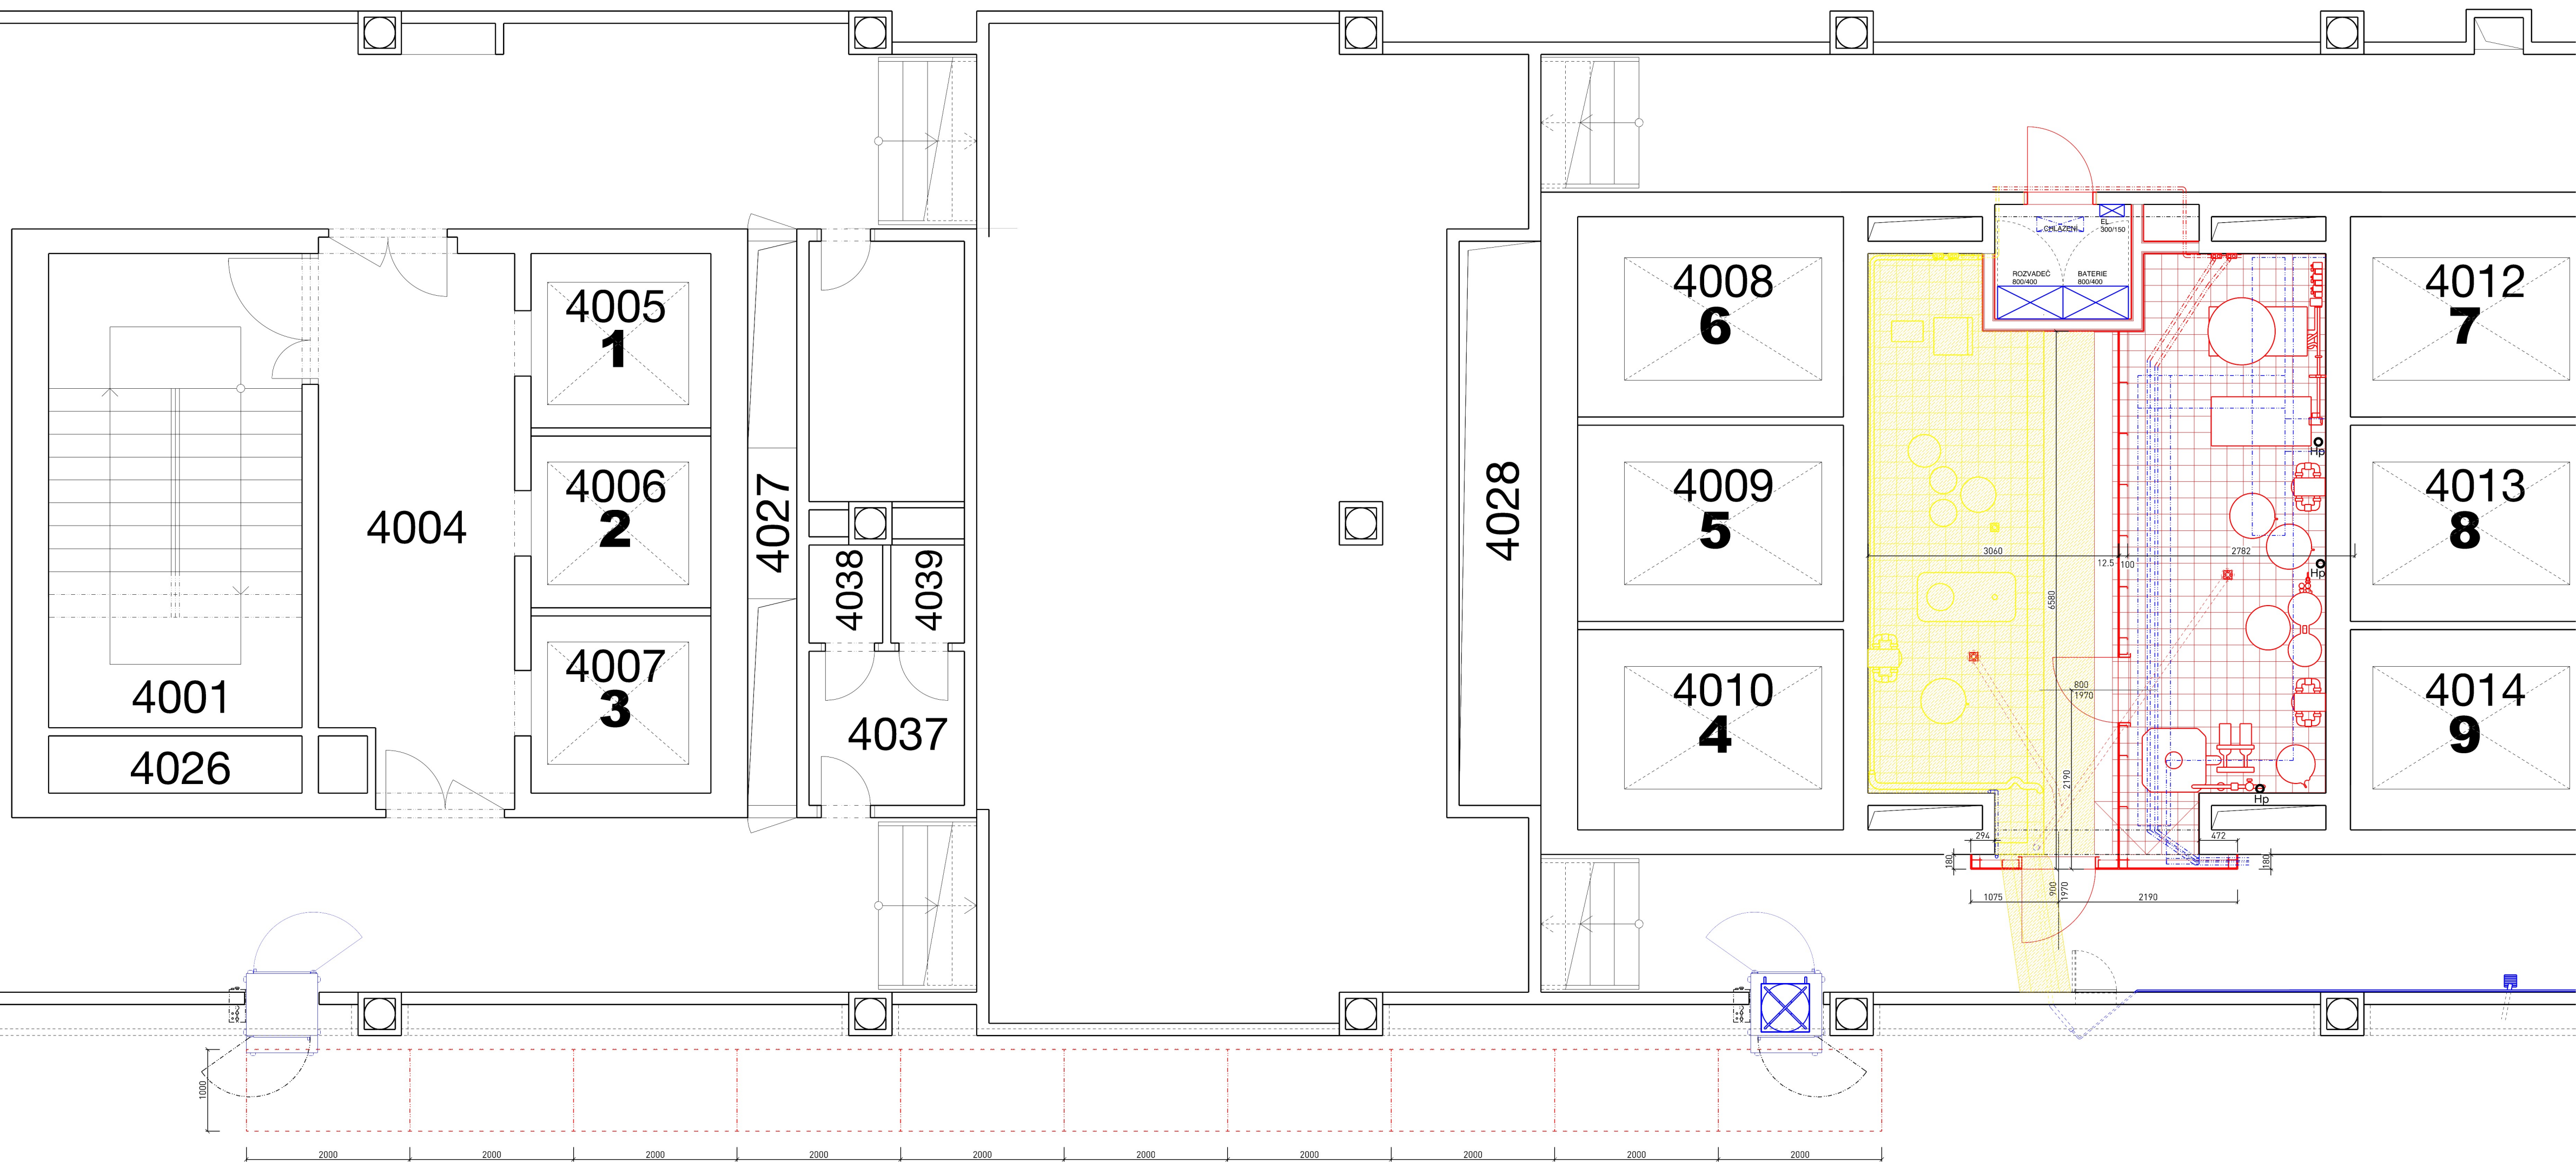

- Poznámky:
- Výkres zahrnuje 5. etapu stavby
 - Bude demontována provizorní dělicí příčka a materiál z ní bude ponechán na místě pro následný krok jejího dalšího použití k předělu stavby na čistý a špinavý provoz.
 - Po zprovoznění nové úpravný vody proběhne demontáž a vystěhování odpojené půdovni technologie úpravný vody a veškerých technických rozvodů s ní souvisejících.
 - Následně proběhne montáž provizorní dělicí SDK příčky do nové polohy dle výkresu.
 - Bude vybourána zvýšená zachytňá vana a dále snížena vybouráním plocha podlahy na úroveň -0,080. Dále bude proveden do podlahy průraz pro podlahovou vpusť, její osazení a bude provedeno její napojení na stávající odpadní potrubí pod stropem.
 - Bude odbourána nadbetonávka odpadního potrubí na kondenzát v koridoru před úpravnou vody. Trubka bude zasekána do podlahy a napojena na odpadní potrubí stejně jako odpadní trubky od nových podlahových vpustí v místnosti s úpravnou vody. Podlaha v koridoru bude následně zapravena betonem určeným pro vyrovnávání podlah - SOUDACONCRETE

Revize — 00 | Souřadnicový systém - BVP | 0,000 - XXX m n.m. |

Akce — Rekonstrukce úpravný vody | Místo stavby — FNB, objekt L, 4.NP |

Parcela — 2876, 3140 | Katastrální území — Starý Lískovec (612014) |

Investor — FNB, Jihlavská 20, 625 00 Brno |

Vypracoval — Ing. arch. Jiří Marek |

Stupeň — Dokumentace pro provedení stavby | **Část - Architektonicko stavební řešení | 5. etapa stavby** |

● Výkres — Půdorys 4.NP - řešená část | Číslo výkresu — 06 | Měřítko — 1:50 | Datum — září 2024 |
