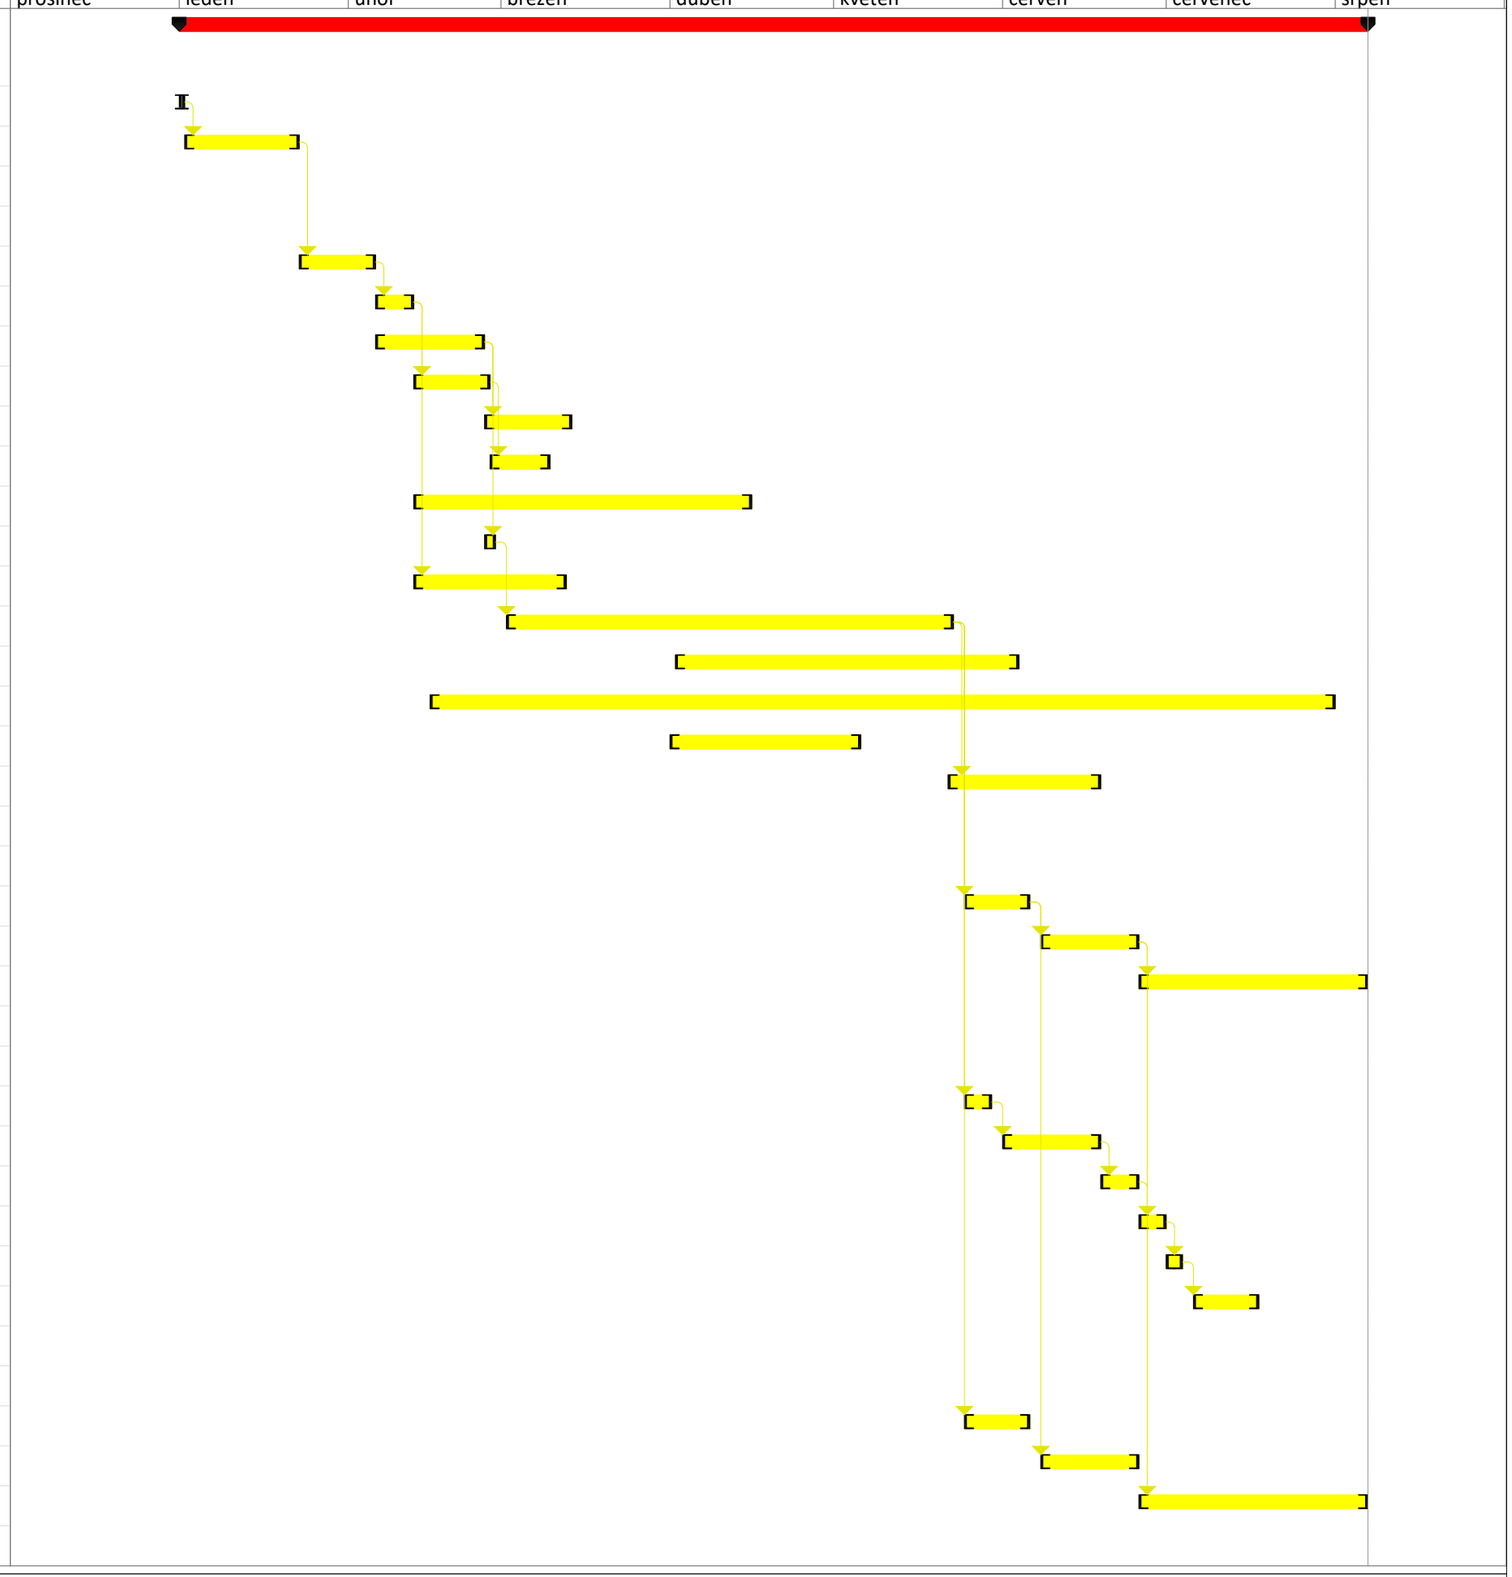ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předcl
1	**FN Brno - Energeticky úsporná opatření objektu 9**	156 dny	01.01. 26	06.08. 26	
2	Předání staveniště	1 den	01.01. 26	01.01. 26	
3	Zařízení staveniště a příprava	15 dny	02.01. 26	22.01. 26	2
4					
5	SO01 - budova 9				
6	stěhování, přípravné práce	10 dny	23.01. 26	05.02. 26	3
7	bourací práce	5 dny	06.02. 26	12.02. 26	6
8	zemní práce	14 dny	06.02. 26	25.02. 26	
9	podlahové kce	10 dny	13.02. 26	26.02. 26	7
10	příčky, SDK, podhledy	12 dny	26.02. 26	13.03. 26	8
11	povrchové úpravy stěn a příček	7 dny	27.02. 26	09.03. 26	9
12	ostatní vnitřní práce	44 dny	13.02. 26	15.04. 26	
13	lešení	2 dny	26.02. 26	27.02. 26	8
14	okna	20 dny	13.02. 26	12.03. 26	7
15	fasáda	60 dny	02.03. 26	22.05. 26	13
16	střecha	45 dny	02.04. 26	03.06. 26	
17	VZT, ZTI, UT	120 dny	16.02. 26	31.07. 26	
18	ELE, SLP	25 dny	01.04. 26	05.05. 26	
19	zpevněné plochy - okapový chodník	20 dny	22.05. 26	18.06. 26	15
20					
21	SO02 - zpevněné plochy				
22	bourací práce	10 dny	25.05. 26	05.06. 26	15
23	zemní práce	14 dny	08.06. 26	25.06. 26	22
24	zpevněné plochy	30 dny	26.06. 26	06.08. 26	23
25					
26	SO03 - Areálová kanalizace				
27	bourací práce	5 dny	25.05. 26	29.05. 26	15
28	zemní práce	14 dny	01.06. 26	18.06. 26	27
29	trubní vedení	5 dny	19.06. 26	25.06. 26	28
30	zásypy	3 dny	26.06. 26	30.06. 26	29
31	dokončovací práce	3 dny	01.07. 26	03.07. 26	30
32	zpevněné plochy	10 dny	06.07. 26	17.07. 26	31
33					
34	SO04 - Odstavné plochy				
35	bourací práce	10 dny	25.05. 26	05.06. 26	15
36	zemní práce	14 dny	08.06. 26	25.06. 26	22
37	zpevněné plochy	30 dny	26.06. 26	06.08. 26	23
38
